

Slutrapport arbetsmarknadsprojekt

Attraktiv Ronneby Landsbygd 2020



Projektägare: Bygd i Samverkan Bräkne Hoby

Samarbetsparter: Enheten för Arbetsmarknad och Integration i Ronneby kommun, Ronneby Kommunbygderåd, Saxemara samhällsförening, Backaryd samhällsförening och Järnaviks Skärgårdsförening

Löptid: 1 mars – 31 december 2020

Arbetsledare: Stefan Rehberg

Arbetslag: Percy Håkansson, Abdulhalim Alhatem, Kheir Eddin Albyat
Mahmoud Alaaedi, Ziad Al Ali, Anders Johansson, Ahmad,
Ammar Alkarim (från 1 september 2020)

Projektledare Aline Nysingh

Projektgrupp: Bosse Svensson (Saxemara samhällsförening, Ronneby Kommunbygderåd), Jan Erik Ronneback (Backaryd samhällsförening, Ronneby kommunbygderåd), Ola Pagels (Bygd i Samverkan) Gerd Nielsen (kassör, Bygd i Samverkan) Tommy Kalmteg, Ronneby Kommunbygderåd , Ola Johansson, projektledare RonnebySlingor



1.1. Syfte

Syftet med projektet är tvåsidigt:

- ge Ronneby kommuns nyanlända och arbetssökande språk och arbetspraktik samt kompetensutveckling tillsammans med svensktalande personal för att skapa möjlighet att få arbete på arbetsmarknaden som ett tydligt slutmål.
- att öka Ronneby kommuns attraktionskraft för besökare och turister genom att utveckla och förbättra och underhålla naturmiljöer för besöksmål, leder mm.

1.2 Beskrivning av arbetslagets verksamheten

Arbetslaget rekryterades genom en förhandsuttagning som Arbetsmarknadsenheten gjorde; efter en 'speeddating' med representanter från Bygd i Samverkan och Saxemara samhällsförening blev 5 nyanlända och 2 svenska (som jobbade under förra arbetsmarknadsprojektet hos Bygd i Samverkan) valda.

Under månad mars började laget att genomföra verksamheter på grund av försköningspengar ansökningar som Saxemara och Backaryd samhällsförening och Järnaviks Skärgårdsförening gjort och fått godkända för underhåll och förbättringar. Samtidigt fick laget olika utbildning däribland röjsågshantering. Det verkade som att alla deltagare hade bra baskunskaper, och alla blev godkända i röjsågsexamen. Redan från början drog vi slutsatsen att arbetslaget med arbetsledare funkade mycket bra: alla var mycket motiverande och vetgiriga.

Efter nödvändiga utbildningar kom arbetslaget riktigt på gång: projektledaren tillsammans med projektgruppen planerade alla försköningsverksamheter som föreningarna i Backaryd, Saxemara, Bräkne Hoby och Järnavik hade ansökt.

I § 2 finns översikten av alla verksamheter som genomfördes av laget under perioden mars – december 2021.

Coronapandemin blev under mars månad allvarligt i Sverige. Virusets kom att påverka svenska samhället i mycket hög grad. Både i arbetslaget och i projektgruppen företogs smittskyddande åtgärder. Arbetslaget jobbade mest ute och kunde behålla avstånd och projektgruppen höll möte utomhus eller via Skype. En medarbetare hjälpte kostnadsfritt till med utkörning av varor till riskgruppen i Bräkne Hoby området; det tog 2 halvdagar i veckan från mars till och med maj månad. Både kunderna och Ica Nära Bräkne Hoby uppskattade insatsen högt.

Under april inventerade Ola Johansson och Stefan Rehberg olika verksamheter inom RonnebySlingor projektet däribland underhåll av Vildmarksleden och möjligheter för anknytning med Gummagölsmåla. Genom att arbetslaget kunde delas upp i 2 eller 3 små grupper (alla medarbetare hade bra kunskaper och kompetens för att jobba självständigt) kunde man jobba effektivt på 2 eller 3 olika ställen. I §2 finns också en översikt med alla platser där arbetslaget har jobbat.

Speciell uppmärksamhet fick arbetslaget med allt arbete i Saxemarans naturpark: de röjde strandområdet, byggde spång och 2 badbryggor (varav en handikappanpassad), en enastående förvandling av hela området! Naturparken fick sedan väldigt mycket besök under hela so: invånare, campinggäster, folk på endagsflukt men också olika tjänstemän från Ronneby kommun. Hela projektet blev därför väldigt mycket uppskattat!





Genom att projektet RonnebySlingor blev medfinansierat i projektet har arbetslagets insatser fått en mycket större omfattning och utförts på landsbygden i hela Ronneby kommun. Arbetslagets insatser och projektgruppens engagemang har gett upphov till många positiva reaktioner genom ett stort antal invånare och besökare:

"Hej, igår testade vi den nya stigen som röjts upp mellan Årsjövägen och Hobyvägen. Funkade mycket bra, kom ut på gång/cykelbanan utan att behöva vara ute på Hobyvägen. Bra jobbat, Jan-Erik och gänget som röjt upp så fint! Förmedla detta till arbetslaget!" (invånare i Backaryd)

"Jag har varit vid Saxemara yttre badplats ikväll. Med stöd från kommunen har Saxemara samhällsförening i samarbete med Bygd i Samverkan från Bräkne-Hoby rensat och röjt hela badplatsen. Vilket fint jobb! En eloge till alla inblandade." (Saxemara Samhällsförening facebook sida)



Byggnation av vindskydd vid Hållabäcks kvarn



Stefan Rehberg, Ola Johansson och Daniel Granello vid den nya bryggan i Lillegård naturreservat



Röjning i Listerby



Röjning vid ICA Johannishus



Ny vindskydd och grillplats vid Ebbemåla kvarn

1.3 Projektgrupp

Projektgruppen träffades varje vecka för att kolla fortsättning och (tim)budgeten/redovisning, avvikelser från försköningsansökan, utvärdering av de arbeten som har gjorts och planera fortsatta arbeten inom projektets ram. Bygd i Samverkan kassör redovisade till projektgruppen varje vecka en uppdaterad ekonomirapport vilket gjorde att projektgruppen hade fullständig koll på hela budgeten.

Från september sammanfogades RonnebySlingor arbetsgrupp och ARL projektgrupp; arbetsmetoden blev ännu effektivare och samtidigt blev möten också en idébank för förbättringar av olika platser/verksamheter i projektet och gav upphov till nya framtidsplaner. Samarbete i gruppen gick väldigt bra med på grund av olika kunskaper som alla deltagare har!



Projektgrupp möte ute under pandemin...!

1.4 Kompetensutbildning

Arbetslaget fick följande utbildning:

- röjsågsutbildning (av Stefan Rehberg), examen via Studieförbundet Vuxenskolan, alla blev godkända och fick betyg.
- motorsågsutbildning (av Stefan Rehberg), examen via Studieförbundet Vuxenskolan, alla blev godkända och fick betyg.
- landskap-, natur- och kulturmiljöutbildning (5 deltagare) av Helene Reiter som också examinerade alla blev godkända och fick betyg.
- svenska språkundervisning (5 deltagare) av Annette Nilsson via Studieförbundet Vuxenskolan. På grund av ytterliga åtgärder för att förhindra smittspridningar, fick kursen avbrytas i förtid i november 2020.



Naturutbildning på Örserydskolan



Utdelning av naturvårdsbetyg med Helene Reiter

Tyvärr också på grund av pandemin blev besök hos olika företag/arbetsgivare inte av. Projektet fortsätter dock året 2021 så både språkundervisning och företagsbesök ska planeras när det åter blir möjligt.


Alla deltagare får i samband med att de slutar en kompletterad meritförteckning med beskrivningar och bilder av verksamheter och kompetensutveckling som man har gjort/följt under projektperioden.

Alla medarbetare har varit positiva om arbetsledaren. Stefan Rehberg anses som en duktig, tydlig och motiverande handledare. Ibland saknade några medarbetare Stefan på plats. Anledningen var olika möten och inventeringar som Stefan ofta var tvungen att delta i och utföra. Å andra sidan lärde laget sig att jobba självständigt som är också en viktig del av kompetensutvecklingen.



1.5 Marknadsföring

Resultaten av projektets arbeten och resultat olika verksamheter blev uppvisade på Bygd i Samverkans och Kommunbygderådets hemsidor, på Landsbygds-tv, Facebook och i ett gemensamt nyhetsbrev som skickades till alla relevanta parter. Därtill fick projektet regelbundet uppmärksamhet i lokala och regionale tidningar.

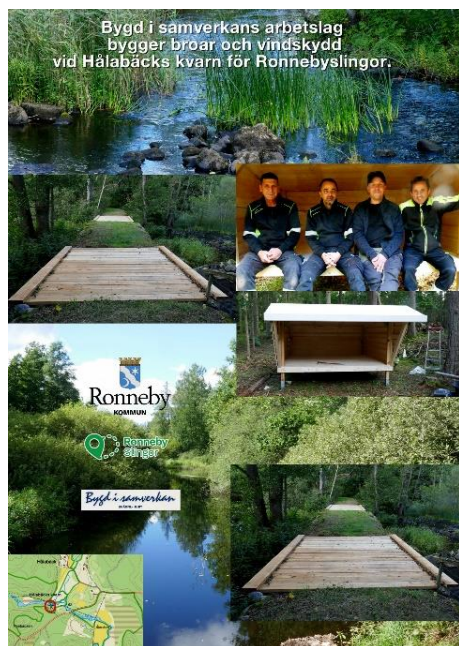

1.6 Slutsats

Alla utlovade aktiviteter har genomförts med ett mycket gott resultat och deltagarna har genom praktik kompetensutvecklats både yrkesmässigt och språkmässigt. Vi konkluderar följande punkter:

- Röjningsarbetet som utförts har varit av hög klass vilket har kommenterats av personer i området med egen kunskap i röjning
- Personerna har varit positiva och glada då de mött besökande i området och tagit sig tid att förklara vad man gjort med stolthet.
- Arbetet har tidvis varit tungt och fysiskt krävande men utförts utan några negativa kommentarer.
- Personerna har tydligt visat förståelsen för slutresultatets mål och varit mån om att nå dessa.

Genom arbetet med projektet Ronnebyslingor över hela kommunen är målet för framtiden att Ronneby landsbygd får ett permanent arbetslag för att arbeta med försköning av Ronneby landsbygd. Därför fortsätter projektet *Attraktiv Ronneby Landsbygd* från januari till och med november 2021 som ett pilotprojekt för att realisera en ny, strukturell underhållsmodell för Ronnebys landsbygd. Med alla erfarenheter under året 2020 finns en robust bas för en dylik modell!

Projektet RonnebySlingor fortlöper t.o.m. juni 2021 och samarbete med arbetslaget fortsätter på samma sätt.

Alla platser har blivit väldigt bra besökta, särskild under Coronapandemin har många sökt sig ut i naturen. Det kommer att finnas behov av underhållsinsatser för att upprätthålla landskapets skönhet. För att besökaren/turisten som finns ska stanna några extra dagar och/eller återvända fordras att besöksmål, leder och byar är välskötta och välkomnade.

Detta har blivit en extra stimulans för att fortsätta våra verksamheter i framtiden!



Picknickbord vid Saxemara yttre badplats

2. Specificering av utförda arbeten *Attraktiv Ronneby Landsbygd 2020*

2.1 Finansieringsbudget /resultatutfall o uppväxling

Medfinansieringspart	Budget Totalt för respektive part	Antal budget timmar á 200 kr/st.	Utförda timmar á 200 kr/st.	Utfall timmar á Värderade till 200 kr/st.
Saxemara Samhällsförening	150 000	750	750	150 000
Järnaviks Skärgårdsförening	80 000	400	400	80 000
Bygd i Samverkan	85 000	425	425	85 000
Backaryds Samhällsförening	108 500	542	542	108 400
Ronneby kommuns arbetsmarknadsenhet varav AF medfinansierar 1 000 000 Arbetslag 7 personer	1 700 000			
Ronneby kommun/ Ronnebyslingorna	390 000	3 500	3 486	697 200
Ronneby kommun/ Ronnebyslingorna över skotts timmar			2 751	550 200
Ideellt arbetade timmar av projektgruppen mm			1 066	213 200
Summa	2 518 500	5617	9 420	1 884 000

Slutsatser:

- Genom Ronneby kommun har försköningsmedel och medel från projektet Ronnebyslingorna finansierat arbeten för besöksmål, leder mm med 813 500 kr. Genom arbetsmarknadslaget i detta projekt har utförts arbeten för 1 884 000 kr (försiktigt beräknade till 200 kr per timma) **Vi kan då dra slutsatsen att insatta medel växlats upp med 1 070 500.**
- Enheten för Integration och Arbetsmarknad har delfinansierat arbetslaget med 700 000 kr. Arbetsförmedlingens finansiering 1 000 000 kr. Deltagarna i Arbetslaget har under projekttiden dels fått en omfattande kompetensutveckling och en mycket bra arbetspraktik samt språkutveckling mm. Dessutom har Ronneby kommun troligen sparat in medel för försörjningsstöd, fått in merskatt på utbetalda löner. **Slutsatsen är att i denna del går också kommunens insats ihop rent ekonomiskt.**



2.2. Tim redovisning t.o.m. vecka 52/utförda timmar

Arbetsobjekt	vecka	antal tim.
Försköningsprojekt		
Saxemara	8 - 44	1532
Backaryd	11 – 48	997
Bräkne Hoby	11 – 48	1009
Järnavik	20 – 44	613
Strångamåla	31 - 44	169
TOTAL		4320
Ronneby Slingorna projekt		
Vildmarksleden (diverse)	15 - 44	772
Eringsboda	21 - 48	85
Listerby	30 - 44	276
Byggnation skyld vandringsled	31 - 48	44
Hållabäck	32 - 44	234
Johannishus	35 - 52	203
Räntamåla	36 - 44	24
Koshult	36 - 44	98
Örseryd	36 - 44	24
Skärsviken	36 - 44	106
Ebbemåla	36 - 52	265
K 14	36 - 48	116
Äggaboden/Linbasta	36 - 44	10
Karlsnäsleden	40 - 52	285
Lillagärde – Dönhult	40 - 48	699
Öljehult V-leden	44	55
Hjälmsafallen	42 - 44	96
Repemålagård	45	32
Garnanäs	48 - 52	54
Markering Bräkne leden	48	8
TOTAL		3486
Total extra för RS: 717 (arbetsledare) + 2034 (överskott försköning tff RonnebySlingor)		2751
TOTAL		6237

2.3 Fördelning timmar + överskotts timar

- Arbetstimmar arbetsledare ARL: 1 mars – 31 december 2020: **1434** (exkl. semester)
50% för Ronneby Slingorna: **717**
- Överskotts timar i förhållande till försköningsbudget som tillhör RonnebySlingor projekt (godkänds i projekt-och arbetsgruppen)

Saxemara:	782
Bräkne Hoby	584
Järnavik	213
Backaryd	455
Total	2034

2.3.1. Specifikation överskotts timmar

- *Saxemara*

Överskotts timmar härrör sig till största delen till tre saker:

- längre spång vid strandstigen som krävde många extra timmar jämfört med offert
- montering av två nya bryggor med handikappanpassade trappor
- extra arbete för att göra Saxemara naturpark det till ett smultronställe som önskas inom ramen för RonnebySlingor, t.ex produktion av extra bord, bänkar, skyltar och sopstationer

- *Bräkne Hoby*

Överskotts timmar härrör sig till största delen till utökade underhållsarbeten på besöksplatser/rast och grillplatser. På grund av Corona och den nya friluftslivtrends fanns större behov på extra underhåll.

- *Backaryd*

Överskottstimmar härrör sig till: undersöka behov och utföra beskrivning, extra röjningsarbete RonnebySlingor, framtagning av arbetsredskap och underhåll av dessa, extra materialhämtning, tidsåtgång för försköningsarbete som ej planerat.

- *Järnavik*

Överskottstimmar härrör sig till röjning vid infarten till campingen som var en extra begäran från Järnaviks skärgårdsförening. Sedan fanns extra underhållsarbeten på besöksplatser/ rast och grillplatser. På grund av Corona och den nya friluftslivtrends som förstärkandes under Corona pandemin.

2.3.2 Ideella timmar

Utöver timmarna som tillhör den anställda medarbetare, finns många ideella timmar inom projektet.

Uppskattning av ideella timmar:

- Förberedelsearbete för projektet i januari/februari 2020:	120
- Handleda av projektet och förberedning projekt 2021	240
- Närvaro projektgruppens möte varje vecka 2 timmar x 3 personer	196
- Ideellt arbete Saxemara 17 veckor x 30 timmar	510
TOTAL	1066



2.4. Specificering per arbetsobjekt

* Underlag: arbetsledaren lämnar varje fredag ett sammandrag av arbetslagets utförda timmar genom en sammanställning från sin dagbok.

Arbetsobjekt	Vecka	Antal timmar	Kommentarer
Saxemara	8,9	40	förberedning av arbetsledare
Saxemara	10	320	inklusive utbildning laget
Saxemara	11	192	„
Backaryd ishockeybanan	11	32	underhåll
Bräkne Hoby Ekfors	11	16	stormfällda träd
Backaryd ishockeybanan	12	220	underhåll
Bräkne Hoby Ekfors-Dönkhult	12	27	underhåll
Backaryd Åsjömåla	13	124	underhåll
Ekfors	13	120	förberedning röjsågexam
Saxemara	13	32	röjning
Bräkne Hoby Svenmanska	14	8	parkarbete
Saxemara	14	140	strandvård + badbrygga
Raskamåla	14	36	materialhantering grillplats
Backaryd Åajömåla	14	16	röjning + rishantering
Gångstig till sjö	14	16	
Bräkne Hoby Svenmanska parken	15	12	parkarbete
Saxemara spång och parkbänkar	15	32	bygga spång + parkbänkar
Backaryd Åsjömåla	15	32	Röjning och rishantering
Backaryd väg till sjö	15	56	„
Saxemara spång och parkbänkar	15	70	bygga spång + parkbänkar
Backaryd väg till sjö	15	64	röjning + rishantering
RS/Hjorthålan	15	48	underhåll
Saxemara	16	70	spång + parkbänkar
Backaryd väg till sjö	16	64	underhåll
V leden Hjorthålan	16	48	röjning + rishantering
Bräkne Hoby	17	8	parkarbete
Saxemara	17	108	bygga spång bänkar
V-leden Räntamåla	17	88	röjning rishantering
Bräkne Hoby	18	40	parkarbete + infoplatser
Saxemara spång/bänkar	18	56	bygga spånga bänkar
V -leden Hjorthålan	18	24	röjning + rishantering
Bräkne Hoby	19	66	parkarbete + underhåll
Snittinge fallet/Ekfors, infoplatz			
Saxemara	19	68	spångarbete
V leden Örseryd Hålaback	19	109	röjning + rishantering
Bräkne Hoby	20	72	parkarbete + underhåll
Saxemara	20	48	spångarbete
Markering stolparna Vildmarksleden	20	126	
Järnavik Kamrastigen/Fågelskådningsplats	20	20	underhåll

Järnavik övrig	21	24	underhåll
Bräkne Hoby	21	8	underhåll
Vildmarksleden Belganet – Ölkehult + Hålla Bäckskvarn	21	68	markeringsstolpar + röjning
Eringsboda	21	16	röjning
Bygga picknickbord för olika platser	21	32	
Bräkne Hoby	22	60	underhåll + parkarbete
Saxemara	22	32	jordarbete
Vildmarksleden Ölkehult Ebbemåla	22	69	markeringsstolpar
Eringsboda	22	8	röjning
Järnavik	22	14	underhåll bastuviken
Bräkne Hoby Sven Park + underhåll	23	40	parkarbete
Vildmarksleden Ebbemålaskvarn Ölkehult Tjurkhult	23	64	röjning + förberedning vindskydd grillplats
Saxemara	23	48	spång + bänk
Backaryd	23	16	underhåll
Bräkne Hoby	23	4	verksamheter turistbyrå
Bygga picknickbord	23	14	spång + bänk
Saxemara	23	14	byggnation badbrygga
Backaryd	24	16	underhåll
Vildmarksleden Räntemåla	24	32	markeringsstolpar
Bräkne Hoby Ekebacken Snittingefallet Pestkyrkogården	24	58 8 26	underhåll + restaurering
Järnavik	24	71	underhåll
Saxemara	24	8	underhåll
Bräkne Hoby Sven Park Infoplatser Ekfors	25	16 20 12	underhåll
Backaryd	25	16	underhåll
Järnavik Garanäs	25	32 48	
Bygga picknickbord olika platser	25	16	
Saxemara	25	24	underhåll
Bräkne Hoby	26	72	„
Backaryd	26	16	„
Sommarfest ARL	26	48	förberedning
Saxemara	26	64	byggnation handräcke, rishante
Vildmarksleden Belganet	26	24	underhåll
Bygga picknickbord olika platser	26	32	
Backaryd	27	32	underhåll
Bräkne Hoby	27	60	„
Saxemara	27	28	bygga soptunnor
Vildmarksleden Belganet	27	24	underhåll
Järnavik	27	6	underhåll
Hålabäck kvarn	30	64	byggnation bron över Bräkne År
Backaryd	30	16	underhåll
Listerby Slättanäs Infart	30	64	Röjning + rishantering

Bräkne Hoby Sven P + Infoplats	30	67	underhåll
Järnavik Fågelskådningsplats	30	16	„
Maskinvård generellt	30	14	
Backaryd	31	32	underhåll
Listerby/Slättanäs	31	74	underhåll
Bräkne Hoby Svensanska Parken Donhult Ekfors Samåkningsplats	31	24 40 16	underhåll
Vandringsled	31	29	byggnation vägskylt vandrings led Örseryd
Saxemara underhåll grillplats	31	8	underhåll grillplats
Järnavik underhåll grillplats	31	8	„ „
Bräkne Hoby	31	8	underhåll
Strångamåla	31	15	röjning
Backaryd	32	16	underhåll
Järnavik	32	72	„
Bräkne Hoby	32	32	„
Strångamåla	32	32	röjning
Saxemara	32	40	bygga picknick bord
Listerby	32	32	underhåll
Backaryd	34	16	„
Järnavik	34	144	infart camp +underhåll grillplats
Saxemara	34	8	vägskylt
Bräkne Hoby	34	16	„
Strångamåla	34	32	grushantering
Hållabäck	34	24	byggnation grillplats
Saxemara	35	60	byggnation vägskylt
Backaryd	35	20	inkl. målningsarbete
Strångamåla	35	82	grushantering
Hållabäck	35	32	byggnation vindskydd
Johannishus	35	66	röjning
Backaryd	36	37	målningsarbete
Räntamåla	36	16	underhåll
Hålabäck	36	40	byggnation vindskydd
Listerby lekplats	36	58	röjning
Kurshult	36	32	stolpar V leden
Strångamåla	36	8	byggnation picknickbord
Eringsboda	36	26	stolpar V-leden
Listerby	37	48	röjning lekplats
Bräkne Hoby: Evaryd	37	24	underhåll
Hålabäck	37	16	byggnation grillplats
Backaryd	37	12	målningsarbete
Örseryd	37	24	byggnation grillplats
Eringsboda	37	4	stolpar V leden
Koshult	37	24	röjning V leden
Skärsviken	37	26	byggnation grillplats
Järnavik	37	10	fågelskådningsplats
Koshult	38	32	V leden röjning
Backaryd	38	16	underhåll

Skärsviken	38	80	„ + byggnation picknick bord
Bräkne Hoby	38	74	underhåll bygdegård/infart
Ebbemåla kvarn	38	26	röjning
K14 längste grusväg	38	26	röjning + stolpar
Ebbemåla kvarn	39	64	byggnation vindkydd
Backaryd	39	16	underhåll
K 14	39	64	underhåll + stolpar
Bräkne Hoby / Snittinge/ Dönhult	39	32	underhåll
Järnavik/Näset	39	16	underhåll
Äggaboden/Linbasta	39	10	röjning
Djuparforskyftan/Karlsnäsleden	40	64	underhåll
Backaryd	40	24	„
Ebbemåla kvarn	40	16	byggnation vindskydd
Järnavik/Kamrastigen	40	12	underhåll
Saxemara	40	36	„
Karlsnäsleden	40	44	34 bygga spång 10 underhåll
K14	40	10	markering stolparna
Karlsnäsleden	41	42	underhåll
Backaryd	41	16	„
Ebbemåla	41	64	byggnation vindskydd
Järnavik/Svålamåla	41	48	underhåll
Räntamåla	41	16	markeringsstolpar
Hållabäck	41	10	röjning
Strångamåla	41	5	byggnation vindskydd
Järnavik/Garnanäs	42	48	underhåll
Hållabäck	42	64	röjning
Backaryd	42	8	underhåll
Strångamåla	42	16	
Lillagärde	42	63	
Ebbemåla	42	18	picknickbord
Hjälmsafallet	42	26	
Lillagärde	43	53	
Hjälmsafallet	43	65	
Ebbemåla	43	8	
Hållabäck	43	48	
Ebbamåla	44	32	grillplats
Öljehult V leden	44	55	
Järnavik/Garnanäs	44	8	
Lillegärd	44	32	
Hjorthålan – Koshult	44	10	
Hjälmsafallen	44	5	
V leden Lillegärde Dönhult	45	84	
Backaryd	45	8	underhåll
V leden Eringsboda	45	8	„
Byggnation vindskydd handrücke	45	33	
V leden Repemålagård	45	32	röjning
V leden Lillegärde Dönhult	46	238	„
V leden Lillegärde Dönhult	47	229	„
Byggnation grillplats	47	5	

V leden Strångamåla vindskydd	48	88	byggnation vindskydd
Bräkne Hoby	48	16	jul belysning
Bräkne leden Örseryd – Bräkne Hoby	48	8	markering
K 14	48	16	„
V leden Belganet Knällsberg	48	48	„
Byggnation vägs skyltar	48	13	
Garnanäs	48	26	markering
Johannishus	49	72	röjning
Karlsnäsleden	49	78	markeringsstolpar
Ebbemåla kvarn	49	21	halkskydd bro
Johannishus	50	48	röjning
Karlsnäsleden	50	48	markeringsstolpar
V leden BH – Eringsboda	50	8	markering R slingor markör
Garnanäs – Pilken	51	28	markeringsstolpar
Bräkne Hoby – Eringsboda	51	24	markering R slingor markör
Karlsnäsleden	51	53	markeringsstolpar
Johannishus	51	15	röjning
V-leden	52	16	markering
Ebbemåla	52	24	halkskydd bro



3. Ekonomirapport Attraktiv Ronneby Landsbygd 2020

	Budget	Utfall	Kvar
Lön arbetsledare	377138	373862	3276
Lön projektledare	96915	96915	0
Hyrda Bilar	70892	70892	0
Reseersättning	52860	52860	0
Arbets/skyddskläder	31586	31586	0
Maskinkostnader	34308	34308	0
Förbrukningsmaterial	36830	36830	0
Drivmedel bilar	30999	30999	0
Overhead	61200	61200	0
Kompetensutbildningar	18100	18100	0
Dokumentation	2172	0	2172
Summa	813000	807552	5448

Väntar in från skatteverket tillbakabetalda soc avgifter 26724:-

Restbudgeten 32172:- överförd till ARL 2021

Möblerat om i budgeten Okt.

Ändrat i budgeten december

Hyrda bilar	-6358	Dokumentation	-2828	Resor	+ 2860
Förbrukningsmaterial	+6358	Kompetens	-6900	Förbrukning	+5472
Dokumentation	-10000	Löner	-497	Drivmedel	+2999
Drivmedel bilar	+8000	Arbetskläder	-414		
Arbetskläder	+2000	Maskinkostnader	-692		

Bräkne-Hoby 2020-12-29

Medfinansiering från föreningar 423000:-

Medfinansiering från Kommun-
bygderådet 390000:-

Gerd Nielsen

Summa..... 813000:-

kassör Bygd i Samverkan
